

जलागम प्रबन्धन विभाग

# प्रगति प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2015 - 2016



अप्रैल, 2016

जलागम प्रबन्धन निदेशालय, उत्तराखण्ड

इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालौनी, देहरादून।

wmd-ua@nic.in <http://wmduk.gov.in>

## उत्तराखण्ड राज्य में जलागम प्रबन्धन की वर्तमान स्थिति

देहरादून स्थित जलागम प्रबन्धन विभाग राज्य स्तर पर जलागम विकास से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा घोषित की गयी नोडल एजेंसी है। इसके विभागाध्यक्ष मुख्य परियोजना निदेशक हैं। वर्तमान में निदेशालय के अंतर्गत निम्न जलागम विकास सम्बन्धी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

### वर्तमान में संचालित जलागम विकास परियोजनाओं का विवरण एक नजर में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्त पोषण संस्था	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजना अवधि	परियोजना क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	सूक्ष्म जलागम की संख्या	जनपद का नाम	विकास खण्डों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –जलागम विकास	केन्द्र पोषित	618	2010–11 से प्रारम्भ	4256	179	प्रदेश के समस्त जनपद	56	1374	3003
2.	उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना-2 (वाह्य सहायतित)	विश्व बैंक	1020	2014 से 2021	2638	82	देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर	18	509	1066
3.	एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (वाह्य सहायतित)	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष	244	2012 से 2019	702	22	पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत	7	187	377

परियोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अगले पृष्ठों में दिया गया है।

## केन्द्र पोषित कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलागम विकास

### परियोजना का उद्देश्य

राज्य के प्राथमिकता के आधार पर सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन द्वारा उत्पादन बढ़ाकर ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना तथा टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देकर घरेलू आय में वृद्धि करना है।

### परियोजना अवधि


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक कुल 69 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, प्रत्येक परियोजना की अवधि 5 से 7 वर्ष है।

### परियोजना लागत

वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक कुल 69 स्वीकृत परियोजनाओं की लागत रू0 617.78 करोड़ है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश तथा राज्यांश की धनराशि का बंटवारा 90:10 के आधार पर है।

### परियोजना क्षेत्र

यह कार्यक्रम राज्य के सभी 13 जनपदों के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 1374 ग्राम पंचायतों के 3003 राजस्व ग्रामों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे लगभग 206109 परिवार लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम से आच्छादित कुल क्षेत्र 425608 हे0 है।

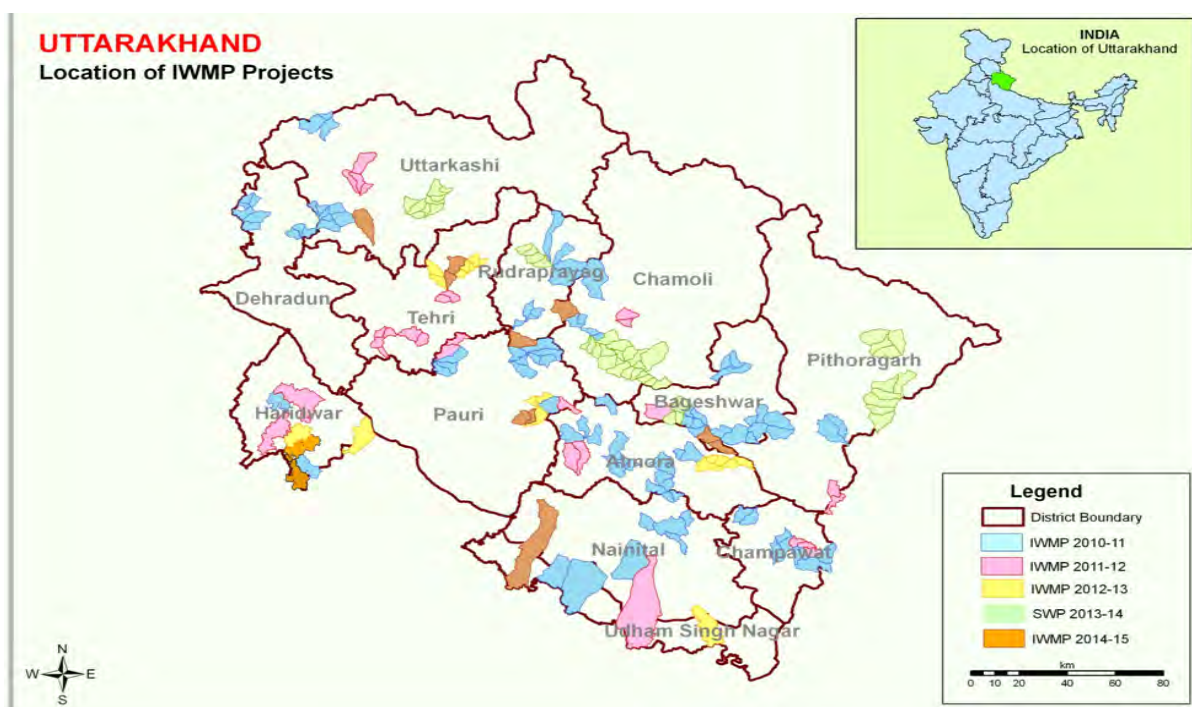

अध्यावधिक भौतिक प्रगति( 31 मार्च 2016 तक)

क्रम सं	कार्यमद का नाम	इकाई	विगत वर्ष तक की प्रगति	वित्तीय वर्ष 2015-16 का लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रगति	परियोजना प्रारम्भ से अब तक की प्रगति
<b>1-</b>	<b>जलागम विकास</b>					
<b>अ</b>	<b>जल संचयन संरचनाएं</b>					
1.	चैकडैम	संख्या	698	810	429	1127
	चैकडैम की जल संग्रह क्षमता	घन मी०	10631	12337	5188	15819
2.	परकुलेशन टैंक	संख्या	4896	1420	206	5102
	जल संग्रह क्षमता	घन मी०	34237	21628	2576	36813
3.	तालाब	संख्या	776	820	1152	1928
	जल संग्रह क्षमता	घन मी०	5547	12489	37729	43276
4.	वर्षा जल संग्रह टैंक, जल संग्रह टैंक,	संख्या	1687	3212	3752	5439
		घन मी०	11540	24400	16181	27721
	पाईप लाइन, सिंचाई गूल	र० मीटर	0	20500	21517	21517
5.	पुराने जल संग्रह संरचनाओं का जीर्णोद्धार	संख्या	400	230	133	533
	अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र में वृद्धि	है०	812	1020	1032	1844
6.	लाभान्वित कृषकों की संख्या	संख्या	33145	44320	8986	42131
<b>ब</b>	<b>मृदा नमी संरक्षण</b>					
1.	मेड़बन्दी	है०	30	76	124	154
2.	सुरक्षा दीवार	मीटर	1230	2010	738	1968
<b>स</b>	<b>वृक्षारोपण/ चारा विकास</b>					
1.	वृक्षारोपण	है०	104	2241	408	512
2.	चारा विकास	है०	44	1830	31	75
<b>2.</b>	<b>भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका सम्बन्धी गतिविधियां</b>					
<b>अ</b>	<b>बकरी पालन</b>					
	संख्या	44	814	76	120	
<b>ब</b>	<b>मुर्गीपालन</b>					
	संख्या	37	277	35	72	
<b>स</b>	<b>डेयरी (दुग्ध उत्पादन)</b>					
	संख्या	97	1205	195	292	
<b>द</b>	<b>मौन पालन</b>					
	संख्या	2	34	1	3	
<b>य</b>	<b>अन्य (बैण्ड, लोहार, बढई, दुकान, सब्जी उत्पादन एवं विपणन आदि)</b>					
	संख्या	17	531	199	216	
<b>3.</b>	<b>उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम</b>					
<b>अ</b>	<b>फलोउद्यान विकास</b>					
	है०	44	122	58	102	
<b>ब</b>	<b>अनाज की फसले (धान, मडुवा, गेहूँ आदि)</b>					
	है०	10	82	179	189	
<b>स</b>	<b>बैमौसमी सब्जी उत्पादन (टमाटर, आलू, बन्द गोभी, शिमला मिर्च आदि)</b>					
	है०	40	203	37	77	
<b>द</b>	<b>मसालों की खेती (अदरक, हल्दी आदि)</b>					
	है०	9	85	57	66	
<b>य</b>	<b>पॉली हाउस</b>					
	संख्या	118	350	0	118	
<b>र</b>	<b>वर्मी कम्पोस्ट, आधुनिक कृषियंत्र आदि</b>					
	संख्या	185	803	1392	1577	

## अध्यावधिक वित्तीय प्रगति (परियोजना कोष)

रु0 करोड़ में

परियोजना स्वीकृति का वर्ष	विगत वर्ष तक की क्रमिक प्रगति	प्रारम्भिक अवशेष (01.04. 2015)	अवमुक्त धनराशि (फरवरी 2016) तक				कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 2015 -16 का व्यय (माह मार्च तक)	परियोजना प्रारम्भ से अब तक का कुल व्यय	अवशेष धनराशि
			केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य प्राप्ति (ब्याज)	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010-11	42.52	11.03	8.90	0.99	2.24	12.13	23.16	19.15	61.67	4.01
2011-12	7.47	3.35	3.48	0.38	0.1	3.96	7.31	3.99	11.46	3.32
2012-13	2.86	1	1.30	0.15	0.01	1.46	2.46	1.65	4.51	0.81
2013-14	2.11	9.97	12.00	1.33	0	13.33	23.30	4.30	6.41	19.00
अविभाजित	-	-	3.13	-	-	3.13	3.13	-	-	3.13
योग	<b>54.96</b>	<b>25.35</b>	<b>28.81</b>	<b>2.85</b>	<b>2.35</b>	<b>34.01</b>	<b>59.36</b>	<b>29.09</b>	<b>84.05</b>	<b>30.27</b>

वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजना की धनराशि को अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना में मात्राकृत किया गया योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान के सापेक्ष माह मार्च 2016 तक की अध्यावधिक वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है-

(रु0 करोड़ में)

कार्यक्रम/ योजना	बजट प्राविधान	अवमुक्त बजट	व्यय	अभ्युक्ति
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलागम विकास घटक	108.48	28.6375	28.6375	अंकित धनराशि में से रु0 2.08 करोड़ योजना के संस्थागत कोष में तथा रु0 32.53 करोड़ परियोजना कोष में जमा किया गया। संस्थागत कोष विगत वर्ष के अवशेष सहित कुल जमा धनराशि से माह तक रु0 1.51 करोड़ किया गया तथा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं (रेखीय विभागों) के माध्यम से परियोजना कार्यक्रमों में विगत वर्षों की परियोजना कोष की अवशेष धनराशि सहित कुल उपलब्ध धनराशि रु0 60.23 करोड़ से वित्तीय वर्ष में माह मार्च 2016 तक रु0 29.09 करोड़ का व्यय किया गया।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलागम विकास घटक - अनुसूचित जाति उप योजना	27.43	5.85	5.85	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलागम विकास घटक - जनजाति उप योजना	4.37	0.12	0.12	
<b>योग</b>	<b>140.28</b>	<b>34.6075</b>	<b>34.6075</b>	

## वाहय सहायतित परियोजनायें

### विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) फेज-2 (IDA Credit No. 5369-IN)

#### परियोजना विकास का उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा बारानी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना है।

#### परियोजना अवधि


परियोजना की अवधि 7 वर्ष है। यह परियोजना दिनांक 15 जुलाई 2014 से प्रभावी हुयी है। अतः परियोजना वर्ष 2014 से 2021 तक संचालित की जायेगी ।

#### परियोजना लागत

कुल लागत 170 मिलियन यू0 एस0 डॉलर (लगभग रू0 1020 करोड़) है, जिसमें विश्व बैंक का अंश 121.2 मिलियन यू0 एस0 डॉलर, राज्यांश 45.8 मिलियन यू0 एस0 डॉलर तथा लाभार्थी अंश 3.0 मिलियन यू0 एस0 डॉलर है।

#### परियोजना क्षेत्र

परियोजना क्षेत्र समुद्र तल से 700–2700 मी0 तक की ऊँचाई के मध्य हिमालयन क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 263837 है0 है। यह परियोजना प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपदों (देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) के 509 ग्राम पंचायतों के 1066 राजस्व ग्रामों में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना से 55,600 परिवार लाभान्वित होंगे।

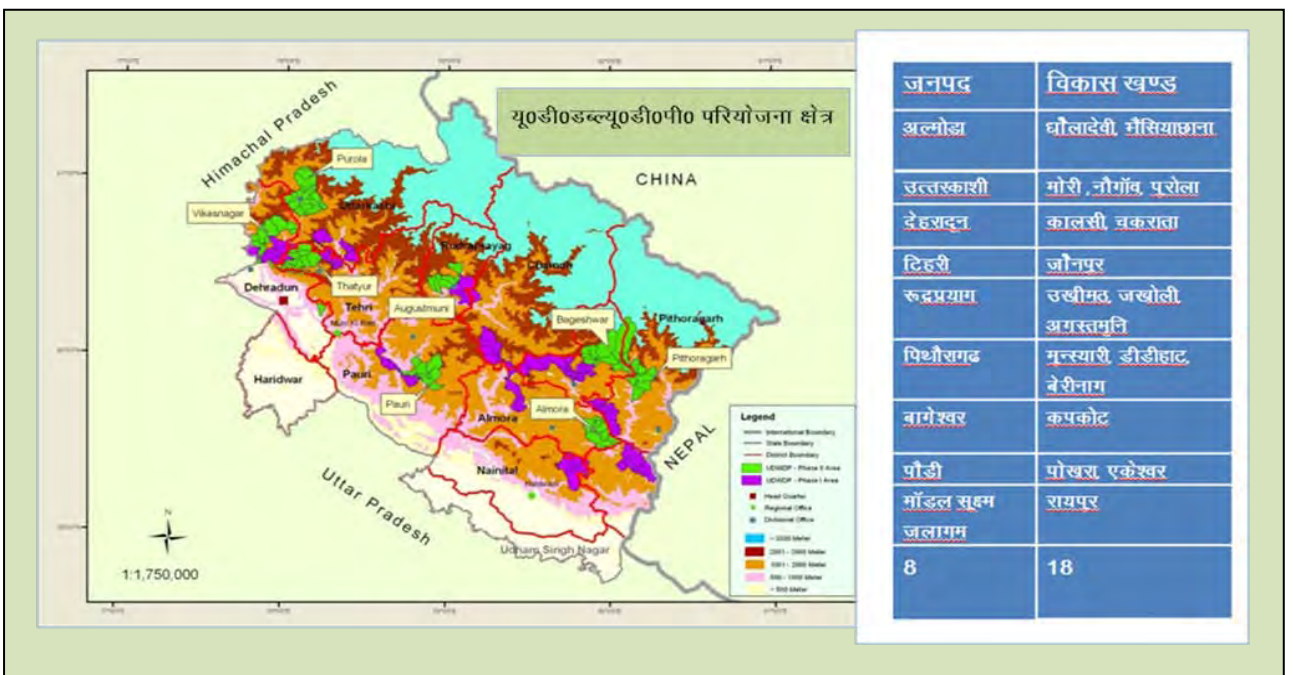

परियोजना के अंतर्गत छः (6) क्षेत्रीय प्रभागों एवं एक पी0एम0यू0 प्रभाग की स्थापना की जा चुकी है। परियोजना के दो (2) प्रभागों रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन कर दिनांक 02 मार्च, 2015 को उनकी तैनाती की जा चुकी है। इन प्रभागों में परियोजना कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। परियोजना हेतु एक समर्पित परियोजना निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त लगभग 60 प्रतिशत फील्ड कार्मिकों की तैनाती की जा चुकी है, आवश्यक अवशेष फील्ड कार्य हेतु कार्मिकों की तैनाती सेवा प्रदाता के माध्यम से की जा चुकी है।

परियोजना हेतु प्रमुख कंसलटेन्सी यथा एफ0एन0जी0ओ0, पी0एन0जी0ओ0 एवं इन्टरनल ऑडिटर का चयन कर तैनाती की जा चुकी है जिनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। परियोजना के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा हाईड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग हेतु चयन की कार्यवाही की जा रही है। परियोजना हेतु एफ0एम0आई0एस0 साफ्टवेयर विकसित कर उपयोग में लाया जा रहा है।

### परियोजना की वित्तीय प्रगति (मार्च 2016 तक)

अध्यावधिक व्यय की स्थिति (बजट प्राविधान के अनुसार— घनराशि लाख रुपये में)

मार्च, 2015 तक की संचयी प्रगति	वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रगति						परियोजना प्रारम्भ से संचयी प्रगति
	परिव्यय	बजट प्राविधान	अवमुक्त बजट	पूर्व माह तक का व्यय	माह में व्यय	क्रमिक प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8
4419.79	9650.73	9680.68	6588.71	4478.25	1598.15	6076.40	10496.19
उक्त बजटेड व्यय के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष में माह तक रु0 247.68 लाख तथा परियोजना प्रारम्भ से अब तक रु0 347.79 लाख लाभार्थी अंशदान के रूप में भी व्यय किया गया।							

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप रु0 96.51 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया था जिसके सापेक्ष आय व्ययक में रु0 26.5041 करोड़ प्राविधानित किया गया, अनुपूरक मांग से प्राविधानित धनराशि को सम्मिलित करते हुए योजना हेतु वर्ष में कुल रु0 9680.68 करोड़ की धनराशि प्राविधानित किया गया।

अध्यावधिक प्रतिपूर्ति की स्थिति (धनराशि करोड़ रुपये में)

मार्च 2015 तक संचयी प्रगति			वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रगति						परियोजना प्रारम्भ से अब तक की संचयी प्रगति		
			वित्तीय लक्ष्य		वर्ष में वास्तविक व्यय		विश्व बैंक द्वारा अवमुक्त धनराशि				
कुल व्यय	प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	वि. बैंक द्वारा अवमुक्त धनराशि	कुल लक्षित व्यय	प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	कुल	प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	वर्ष में व्यय के सापेक्ष	पिछले अवशेष सहित	कुल व्यय	प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	वि. बैंक द्वारा अवमुक्त धनराशि
45.20	18.69	7.25	100.57	61.56	60.76	37.50	8.72	19.30	108.44	56.19	26.55

## परियोजना की भौतिक प्रगति

वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्यमद का नाम	ईकाई	विगत वर्ष तक की क्रमिक प्रगति	2015-16		परियोजना प्रारम्भ से अब तक की प्रगति
				लक्ष्य	प्राप्ति	
<b>घटक 1. सामाजिक संचेतना तथा सहभागी जलागम नियोजन</b>						
1.	पार्टनर एन0जी0ओ0	संख्या	2	2	2	2
2.	फील्ड एन0जी0ओ0	संख्या	2	2	2	2
3.	ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन	संख्या	1065	1066	1397	2462
4.	ग्राम पंचायत एवं उप परि0 निदे0 के मध्य परियोजना गतिविधियों के संचालन सम्बन्धी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर	संख्या	390	140	132	522
5.	जल एवं जलागम समिति का गठन	संख्या	385	145	135	520
6.	राजस्व ग्राम समिति का गठन	संख्या	727	339	262	989
7.	ग्राम प्रेरक का चयन	संख्या	682	384	308	990
8.	लेखा सहायक का चयन	संख्या	323	207	195	518
9.	जलागम समिति का खाता खोला जाना	संख्या	350	180	148	498
10.	ग्राम में आधारभूत आंकड़ों का संकलन	संख्या	199	859	269	468
11.	जल स्रोतों का चिन्हिकरण	संख्या	347	200	177	524
12.	जल स्रोतों के उपचार हेतु योजना का निर्माण	संख्या	21	50	15	36
13.	किसान नर्सरी के लिये लाभार्थियों का चयन	संख्या	29	ल0स0	6	35
14.	ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक व्यय अवमुक्त	संख्या	305	530	110	415
15.	जिला स्तरीय जलागम समिति की बैठक का आयोजन	संख्या	7	8	4	10
16.	ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना का निर्माण	संख्या	56	ल0स0	325	381
17.	सूक्ष्म जलागम योजना का निर्माण	संख्या	4	ल0स0	3	7
<b>घटक 2. जलागम उपचार तथा बारानी क्षेत्र विकास</b>						
1.	जलागम विकास एवं उपचार	संख्या	13	ल0स0	191	204
2.	तालाब निर्माण प्रदर्शन	संख्या	51	ल0स0	17	68
3.	उच्च उत्पादकता कृषि फसल प्रदर्शन (0.2है0)	संख्या	786	1700	1906	2692
4.	एडप्सन सपोर्ट उच्च उत्पादकता कृषि फसल प्रदर्शन	कृषक	0	1260	987	987
5.	उच्च उत्पादकता सागभाजी फसल प्रदर्शन	संख्या	1428	1375	3117	4545
6.	औद्योगिक विकास	हैक्टर	51.5	220	336.7	388.2
7.	सीड एण्ड सीडलिंग	हे0	143	195	352	495
8.	पौलीहाउस निर्माण	संख्या	229	315	364	593
9.	पौलीटनल निर्माण	संख्या	411	835	1065	1476



क्र. स.	कार्यमद का नाम	ईकाई	विगत वर्ष तक की क्रमिक प्रगति	2015-16		परियोजना प्रारम्भ से अब तक की प्रगति
				लक्ष्य	प्राप्ति	
10	वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	संख्या	785	1673	740	1525
11	उन्नत कृषि एवं औद्योगिक उपकरण सैट वितरण	संख्या	125	ल0स0	0	125
12	नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र	संख्या	0	47	41	41
13	पैरावेट (कृत्रिम गर्भाधान सेवा केन्द्र)	संख्या	0	22	16	16
14	पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कैम्प	संख्या	76	142	148	224
15	पशु आश्रय निर्माण	संख्या	322	482	339	661
16	नांद	संख्या	353	964	484	837
17	चरी निर्माण	संख्या	209	450	312	521
18	चारा मिनिफिट	संख्या	1486	3020	3205	4691
19	खेतों की मेढों में नैपियर रोपण	000'मी0	39	640	436	475
<b>घटक-3 आय अर्जन के अवसरों में वृद्धि</b>						
1.	निर्वल वर्ग समूहों के परिवारों हेतु सहायता-व्यक्तिगत परिवार	संख्या	26	1080	346	372
2.	निर्वल वर्ग समूहों के परिवारों हेतु सहायता-समूह	संख्या	4	138	57	61
<b>घटक-4 ज्ञान/जानकारी प्रबन्धन तथा परियोजना समन्वयन</b>						
<b>प्रशिक्षण</b>						
1.	ग्रामीण समुदाय को ग्राम स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण	संख्या	439	437	547	986
2	ग्रामीण समुदाय को प्रभाग स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण	संख्या	78	82	94	172
3.	ग्रामीण समुदाय को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	10	ल0स0	3	13
<b>अध्ययन भ्रमण</b>						
1.	राज्य स्तर 3 दिवसीय (25 प्रतिभागी)	संख्या	89	41	48	137
2.	राज्य से बाहर 5 दिवसीय (25 प्रतिभागी)	संख्या	9	25	8	17
<b>कार्मिकों का क्षमता विकास</b>						
1.	परियोजना स्टाफ क्षमता विकास प्रशिक्षण	संख्या	582	ल0स0	524	1106
2.	परियोजना स्टाफ क्षमता विकास हेतु अध्ययन भ्रमण	संख्या	21	22	12	33
<b>कार्यशाला</b>						
1.	राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यशाला	संख्या	1	6	6	7
2.	निदेशा0/परियोजना कार्यालय स्तरीय कार्यशाला	संख्या	39	26	27	66
3.	प्रभाग स्तरीय कार्यशाला	कार्यशाला	69	42	78	147
4.	ईकाई स्तरीय कार्यशाला	कार्यशाला	225	196	366	591
5.	ग्राम स्तरीय कार्यशाला	कार्यशाला	1342	1086	2079	3421
6.	निदेशालय/परियोजना निदेश0/उप परियोजना निदेशक स्तरीय विशेष कार्यशाला	संख्या	21	ल0स0	23	44

परियोजना के ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना के अन्तर्गत मार्च 2016 तक सम्पादित कार्य:

क्र. सं.	कार्य विवरण	इकाई	2014-15	2015-16 में मार्च,16 तक की उपलब्धि	मार्च,2016 तक क्रमिक उपलब्धि
	<b>कृषि एवं औद्योगिक विकास</b>				
1	कृषि मिनिकिट वितरण (0.04हे0)	सं0	0	20	20
2	कृषि उद्यान उपकरण सैट वितरण	संख्या	0	46	46
3	कृषि खेतों की मरम्मत	घन मी0	0	1098	1098
4	वायो वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण	संख्या	0	72	72
5	उच्च मूल्य फसल मिनिकिट वितरण (0.04हे0)	संख्या	0	4	4
6	घरवाड़ी पौध रोपण(250पौध/हे0)	हेक्टर	0	23.25	23.25
7	औद्योगिक विकास (250पौध/हे0)	हेक्टर	0	1	1
8	पॉली हाऊस निर्माण	संख्या	0	33	33
9	पॉली टनल निर्माण	संख्या	0	26	26
	<b>पशुधन विकास व चारा प्रबन्धन</b>				
1	नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र की स्थापना	संख्या	0	0	0
2	पशु आश्रय निर्माण	संख्या	0	238	238
3	मैन्जर निर्माण	संख्या	0	257	257
4	चरी निर्माण	संख्या	0	114	114
5	नैपियर घास रोपण	हेक्टर	0	4.5	4.5
6	चारा विकास	हेक्टर	0	0	0
7	चैफ कटर वितरण	संख्या	0	35	35
	<b>वानिकी विकास</b>				
1	वन पुनरोद्धार (1000 पौध/हे0)				
1.1	अग्रिम मृदा कार्य	हेक्टर	0	1068.51	1068.51
1.2	वृक्षारोपण	हेक्टर	0	201	201
2	किसान नर्सरी की स्थापना(10000पौध/नर्सरी)	सं0	0	0	0
3	एसिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन औफ ओक एरिया				
3.1	अग्रिम मृदा कार्य	हेक्टर	0	67	67
3.2	वृक्षारोपण	हेक्टर	0	40	40
	<b>उर्जा संरक्षण</b>				
1	सोलर लालटेन का वितरण	सं0	0	101	101
2	सामुदायिक सोलर स्ट्रीट पैनल का निर्माण	सं0	0	132	132
3	पाईन ब्रिकेट मशीन का वितरण	संख्या	0	9	9
	<b>नाला उपचार व मृदा संरक्षण</b>				
1	वानस्पतिक उपचार	वर्ग मी0	0	2450	2450

क्र. सं.	कार्य विवरण	इकाई	2014-15	2015-16 में मार्च,16 तक की उपलब्धि	मार्च,2016 तक क्रमिक उपलब्धि
2	ड्राई स्टोन चैकडैम निर्माण	घन मी0	0	10503	10503
3	क्रेटवायर चैकडैम निर्माण	घन मी0	0	4060	4060
4	रोड साईड भू-क्षरण नियन्त्रण	घन मी0	0	5255	5255
5	रिटैनिंग वाल निर्माण	घन मी0	0	504	504
6	रीवर बैंक प्रोटेक्शन कार्य	घन मी0	0	1888	1888
7	डाईवर्जन ड्रेन का निर्माण	घन मी0	0	25	25
8	1:6 सी.सी. मोर्टार कार्य	घन मी0	0	983	983
	<b>जल संरक्षण संभरण एवं जल श्रोत उपचार</b>				
1	सिंचाई गूल निर्माण	कि.मी.	0	13.919	13.919
2	सिंचाई टैंक निर्माण पाईप लाईन सहित	संख्या	0	168	168
3	वर्षा जल संग्रहण टैंक का निर्माण	संख्या	0	608	608
4	ग्रामीण तालाब का निर्माण	संख्या	4	11	11
5	रिचार्ज पिट का निर्माण	घन मी.	0	2835	2835
6	नालियों का खुदान कार्य	रनिंग मी	0	12780	12780
7	चाल/नौला /खाल पुनरोद्धार	संख्या	0	6	6
8	एल. डी. पी. टैंक निर्माण	संख्या	0	4	4
9	वाटर लिफ्टिंग सोलर पम्प की स्थापना	संख्या	0	2	2
10	एच.डी.पी.ई. सिंचाई पाईप लाईन की स्थापना	रनिंग मी	0	1200	1200
	<b>सम्पर्क मार्ग निर्माण</b>				
1	सम्पर्क मार्ग निर्माण	कि.मी.	0	29.258	29.258
2	सम्पर्क पुलिया निर्माण	संख्या	0	33	33

## अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

### परियोजना विकास का उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता में वृद्धि तथा कृषकों से सम्बन्धित कृषि, चारा, पशुपालन, उद्यान इत्यादि के अन्तर्गत उत्पादकता/क्षमता में वृद्धि कर आजीविका विकास करना।

### परियोजना अवधि

7 वर्ष, 2012 से 2019 तक


### परियोजना लागत

जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा संचालित परियोजना के सहभागी जलागम विकास मद की कुल लागत रु0 244 करोड़ है। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का अंश 164.44 करोड़, राज्यांश रु0 57.14 करोड़ तथा लाभार्थी अंशदान रु0 22.45 करोड़ है।

### परियोजना क्षेत्र

उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल, चम्पावत व पौड़ी जनपद के 7 विकासखण्डों के अन्तर्गत चयनित 22 सूक्ष्म जलागमों में क्रियान्वित कराई जा रही है, परियोजना का कुल क्षेत्र 70194 हे0 है। परियोजना अन्तर्गत 187 ग्राम पंचायतों के 377 राजस्व ग्राम आच्छादित हैं।

### PROJECT AREAS FOR ILSP PROJECT

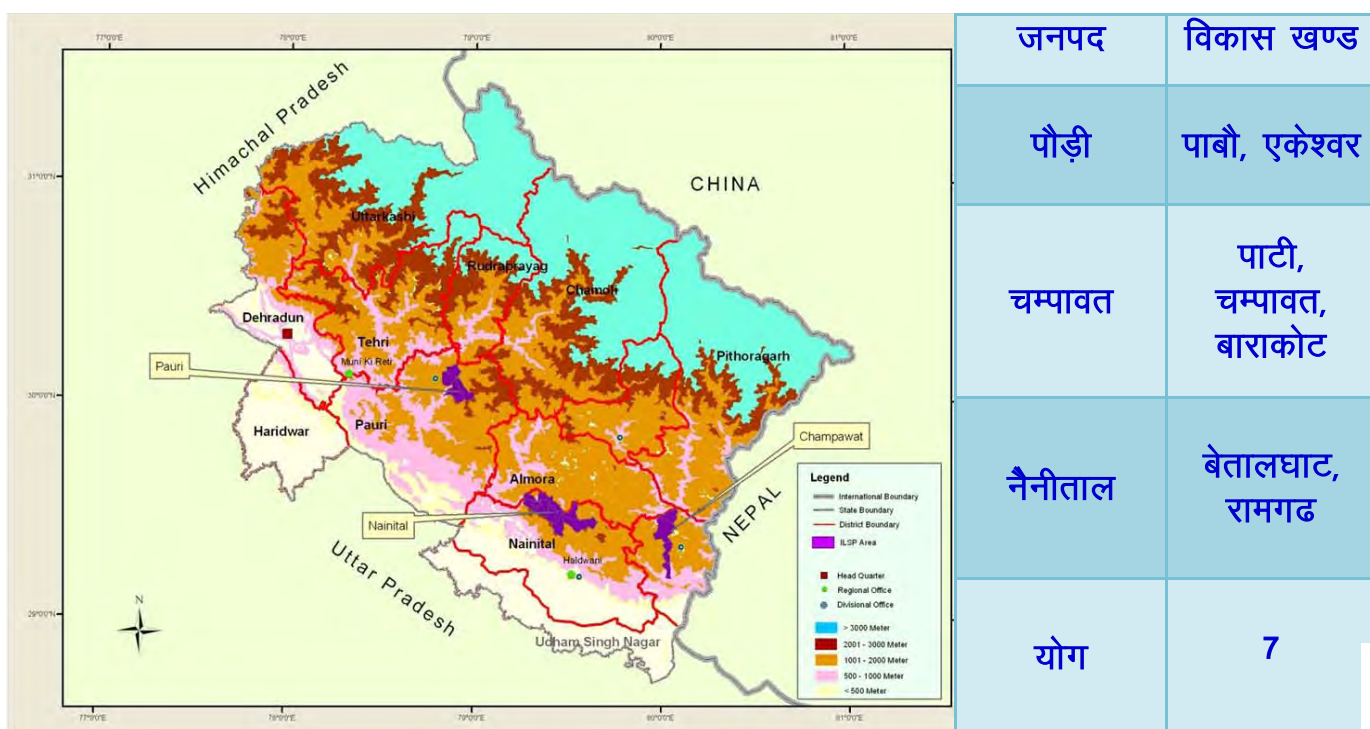

अध्यावधिक वित्तीय प्रगति-31 मार्च 2016 तक (धनराशि लाख रुपये में)

विभागीय बजट की वित्तीय प्रगति

परिव्यय	बजट प्राविधान	अवमुक्त बजट	व्यय
402.26	398.07	398.06	332.91

ग्राम्य विकास से प्राप्त धनराशि व लाभार्थी अंशदान को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय का विवरण

वित्तीय व्यवस्था	मार्च 2015 तक संचयी प्रगति			वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्तीय उपलब्धता			
	कुल व्यय	IFAD वित्त पोषण		वित्तीय लक्ष्य / प्राविधानित धनराशि	01अप्रैल 2015 को अवशेष धनराशि	वर्ष में अवमुक्त धनराशि	वर्ष में अब तक उपलब्ध धनराशि
		प्रतिपूर्ति योग्य	अवमुक्त धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7	8
विभागीय बजट (वेतन भत्ते)	426	0	0	398	0	398	398
ग्राम्य विभाग के बजट से प्राप्त (कार्यमद व संचालन व्यय)	703	605	179	4602	693	2700	3393
लाभार्थी अंशदान (कार्यमद का अंशदान)	37	0	0	0	0	0	0
<b>कुल व्यय</b>	<b>1166</b>	<b>605</b>	<b>179</b>	<b>5000</b>	<b>693</b>	<b>3098</b>	<b>3791</b>

वित्तीय व्यवस्था	वर्ष 2015-16 व्यय विवरण				परियोजना प्रारम्भ से अब तक संचयी प्रगति		
	कुल व्यय	IFAD वित्त पोषण			कुल व्यय	IFAD वित्त पोषण	
		प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	वार्षिक व्यय के सापेक्ष अवमुक्त	विगत वर्ष के अवशेष सहित कुल अवमुक्त		प्रतिपूर्ति योग्य	अवमुक्त धनराशि
1	9	10	11	12	13	14	15
विभागीय बजट (वेतन भत्ते)	333	0	0	0	759	0	0
ग्राम्य विभाग के बजट से प्राप्त (कार्यमद व संचालन व्यय)	3012	2670	847	1273	3715	3275	1452
लाभार्थी अंशदान (कार्यमद का अंशदान)	215	0	0	0	252	0	0
<b>कुल व्यय</b>	<b>3560</b>	<b>2670</b>	<b>847</b>	<b>1273</b>	<b>4726</b>	<b>3275</b>	<b>1452</b>

कार्मिकों के वेतन भत्तों की धनराशि जलागम विभाग के बजट से प्राविधानित कर व्यय की जाती है। परियोजना के विभिन्न कार्यमदों तथा संचालन व्यय की धनराशि का प्राविधान ग्राम्य विकास के बजट के माध्यम से की जाती है। यह धनराशि एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के केन्द्रीय परियोजना समन्वयक ईकाई द्वारा परियोजना के सहभागी जलागम विकास के कार्यों को संचालित किये जाने हेतु अवमुक्त की जाती है जिसे परियोजना के बैंक एकाउन्ट में जमा किया जाता है। परियोजना के कतिपय कार्यों हेतु नियत मात्रा में धनराशि लाभार्थी अंशदान के रूप में भी प्राप्त की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में अध्यावधिक भौतिक (31 मार्च 2016 तक):

क्र. सं.	कार्यमद	इकाई	विगत वर्ष 2014-15 की उपलब्धि	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लक्ष्य	2015-16 माह मार्च 2016 तक उपलब्धि	कुल उपलब्धि
1.	परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या	संख्या	140	47	47	187
2.	ग्राम पंचायतों की संख्या जिसमें परियोजना कार्य प्रारम्भ किया गया	संख्या	139	48	47	186
3.	ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन	संख्या	333	401	602	935
4.	ग्राम पंचायत एवं उप परियोजना निदेशकों के मध्य परियोजना गतिविधियों के संचालन सम्बन्धी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर	संख्या	135	52	51	186
5.	जल एवं जलागम समिति का गठन	संख्या	139	48	47	186
6.	राजस्व ग्राम समिति का गठन	संख्या	249	104	75	324
7.	ग्राम प्रेरक का चयन	संख्या	254	112	80	334
8.	लेखा सहायक का चयन	संख्या	134	53	52	186
9.	ग्राम में आधारभूत आंकड़ों का संकलन	संख्या	134	53	52	186
10.	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें पी0आर0ए0 पूर्ण	संख्या	126	61	60	186
11.	ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना का निर्माण	संख्या	104	83	82	186
12.	ग्राम पंचायत एवं उप परियोजना निदेशकों के मध्य परियोजना गतिविधियों (जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0) के क्रियान्वयन सम्बन्धी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर	संख्या	104	83	82	186
13.	जलागम समिति का खाता खोला जाना	संख्या	115	72	71	186
14.	ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक व्यय अवमुक्त	संख्या	83	104	101	184
15.	ग्राम पंचायतों को जी0पी0डब्ल्यू0डी0 बजट का अवमुक्त किया जाना	संख्या	95	92	88	183
16.	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें उत्पादक समूह गठित किये गये हैं	संख्या	140	47	46	186
17.	गठित किये गये उत्पादक समूह की संख्या	संख्या	960	650	502	1462
18.	उत्पादक समूहों में कृषकों की संख्या	संख्या	9337	5500	4571	13908
19.	पी0आर0ए0 हेतु चयनित निर्बल वर्ग परिवार	संख्या	0	1429	3213	3213
20.	आय अर्जन गतिविधियों हेतु निर्बल वर्ग परिवार (समूह)	संख्या	0	100	171	171
21.	आय अर्जन गतिविधियों हेतु निर्बल वर्ग परिवार (व्यक्तिगत)	संख्या	0	1229	215	215

क्र. सं.	कार्यमद	इकाई	विगत वर्ष 2014-15 की उपलब्धि	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लक्ष्य	2015-16 माह मार्च 2016 तक उपलब्धि	कुल उपलब्धि
22.	ग्राम पंचायतें जहाँ पी0एम0ई0 कमेटी गठित है		0	187	183	183
23.	ग्राम पंचायत स्तरीय संस्थाओं के सदस्यों का सामाजिक क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण	संख्या	787	575	767	1554
24.	ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण	संख्या	55	525	338	393
25.	उत्पादन तकनीकों हेतु प्रशिक्षण	संख्या	24	95	62	86
26.	रिसोर्स सेन्टर पर प्रशिक्षण	संख्या	33	37	32	65
27.	यूनिट स्तर पर आयोजित कार्यशालाएं	संख्या	67	120	218	285
28.	प्रभाग स्तर पर आयोजित कार्यशालाएं	संख्या	20	20	52	72
29.	राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशालाएं	संख्या	0	8	5	5
30.	एक्सपोजर विजिट राज्य में एवं राज्य से बाहर	संख्या	12	121	94	106
31.	विदेश भ्रमण	संख्या	0	0	0	0

### जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 के अन्तर्गत किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति माह मार्च, 2016 तक

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 प्रगति	लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2015-16	इस माह की प्रगति (मार्च 2016)	कुल प्रगति
<b>(अ) ग्राम पंचायत विकास कार्यों का विवरण</b>				
1. नदी नाला संरक्षण एवं भूमि संरचना निर्माण कार्य (घ0मी0)	726.32	125415.7	54757.66	55483.98
2. सिंचाई टैंक (संख्या)	6	277	135	141
3. वर्षा जल संग्रह टैंक(संख्या)	46	1808	1026	1072
4. ग्रामीण तालाब (संख्या)	0	23	01	01
5. सिंचाई गूल (कि0मी0)	0.3	26.9	7.216	7.516
6. बायो कम्पोस्ट पिट (संख्या)	1	406	103	104
7.ग्रामीण सम्पर्क मार्ग/पुलिया(संख्या)	0	80	119	119
8. पशु आश्रय (संख्या)	0	42	0	0
9. मैन्जर/नॉद (संख्या)	1	523	173	174
10. कृषि खेत मरम्मत (घ0मी0)	348.62	10227.74	8225.01	8573.63
11. ईंधन प्रजाति वृक्षारोपण (हे0)	0	15	15	15
12. सिल्वीपाशचर (चौड़ी पत्ती) वृक्षारोपण (हे0)	0	25	43	43
13. वन पुनरोद्धार (हे0)	0	184	123	123

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 प्रगति	लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2015-16	इस माह की प्रगति (मार्च 2016)	कुल प्रगति
14. ए0एन0आर0-बांझ (हे0)	0	158	149	149
15. चारा विकास (हे0)	0	112	231	231
<b>(ब) खाद्य सुरक्षा वृद्धि सहयोग कार्यक्रम</b>				
1.उत्पादक समूह सहयोग प्रथम वर्ष	960	950	506	1466
2.उत्पादक समूह सहयोग द्वितीय वर्ष	1	953	976	977
<b>(स) उत्पादक समूहों के कार्य का विवरण</b>				
1.रबी-फसल एवं दाल उत्पादक(हे0)	159.23	280	560.5	719.73
2.खरीफ- फसल एवं दाल उत्पादक(हे0)	10.88	60	62.55	73.43
3. बेमौसमी साग-भाजी उत्पादक(हे0)	366.77	300	623.81	990.58
4. मसाले 1-हल्दी	10.95	20	8.43	19.38
2-अदरक	15.5	20	29.47	44.97
3-लहसुन	8.3	22	30.5	38.8
4-मिर्च	41.25	25	22	63.25
5-धनिया	8.5	10	43.5	52
6-अन्य	0	0	31	31
5. वृक्षारोपण	0	244	330	330
6. चारा विकास 1-वृक्षारोपण	0	80	80	80
2-घास	0	10	9.5	9.5
7. उद्यान विकास	55.33	242	144.20	199.53
8. अन्य	0	17.7	17.7	17.7



**योजनावार बजट एवं व्यय एक नजर में वित्तीय वर्ष 2015-16 (31 मार्च 2016 तक)**

(रु० लाख में)

क्र. स.	योजना का नाम	परिव्यय	बजट प्राविधान (अनुपूरक सहित)	अवमुक्त धनराशि	व्यय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड	76.00	69.80	47.00	42.48	अवस्थापना व्यय
2	जलागम प्रबन्ध परियोजना अनुश्रवण विकास परिषद	8.60	8.06	00	00	योजना समाप्त की जानी प्रस्तावित।
3	राज्यस्तरीय जलागम परिषद	00	30	30	16.11	
4	समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलागम विकास घटक)	10848	10848	2863.75	2863.75	अंकित धनराशि में से रु० 2.0775 करोड़ योजना के संस्थागत कोष में तथा रु० 32.53 करोड़ परियोजना कोष में जमा किया गया। संस्थागत कोष विगत वर्ष के अवशेष सहित कुल जमा धनराशि से माह तक रु० 1.51 करोड़ किया गया तथा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं (रेखीय विभागों) के माध्यम से परियोजना कार्यक्रमों में विगत वर्षों की परियोजना कोष की अवशेष धनराशि सहित कुल उपलब्ध धनराशि रु० 60.23 करोड़ से वित्तीय वर्ष में माह मार्च 2016 तक रु० 29.09 करोड़ का व्यय किया गया।
5	समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलागम विकास घटक) - अनुसूचित जातियों का कल्याण	2743	2743	585.00	585.00	
6	समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलागम विकास घटक) - जनजातियों का कल्याण	437	437	12.00	12.00	
7	विश्व बैंक सहायतित, उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना-2	9650.73	9680.68	6588.71	6076.40	कार्ययोजना के अनुसार परियोजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अंकित धनराशि के अतिरिक्त लाभार्थी अंशदान से रु० 247.68 लाख प्राप्त कर परियोजना कार्यों में व्यय किये गये।
8	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा पोषित, समेकित आजीविका सहयोग परियोजना	402.26	398.07	398.06	332.91	केवल स्टाफ के वेतन भत्तों की मदों पर व्यय। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की वित्तीय व भौतिक प्रगति, ग्राम्य विकास विभाग के रिपोर्ट में सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष में कार्यमद एवं औपरेटिंग कॉस्ट के मद में रु० 3011.84 लाख व्यय किया गया इसके अतिरिक्त रु० 215.09 लाख लाभार्थी अंशदान से प्राप्त कर परियोजना कार्यों में व्यय किया गया।
<b>योग-</b>		<b>24165.59</b>	<b>24214.61</b>	<b>10524.52</b>	<b>9928.64</b>	

## योजनावार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य

(रु० लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रस्तावित लक्ष्य	टिप्पणी
1	2	3	4
1	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड	76.00	अवस्थापना व्यय
2	राज्यस्तरीय जलागम परिषद	36.70	मा० उपाध्यक्ष, जलागम परिषद के मानदेय एवं अन्य भत्तों हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम	26728.81	केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु धनराशि का प्राविधान बजट में किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार इस योजना को 90:10 में पोषित करती है।
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम - अनुसूचित जातियों का कल्याण	6428.45	---तदैव---
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम - जनजातियों का कल्याण	676.68	---तदैव---
6	विश्व बैंक सहायतित, उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना-2	16076.87	विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यह योजना प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपदों के 509 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार धनराशि प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण की प्रतिपूर्ति 90:10 के अनुसार करती है।
7	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा पोषित, समेकित आजीविका सहयोग परियोजना	492.08	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा पोषित इस योजना के जलागम घटक का क्रियान्वयन जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु क्षेत्र में स्थापित कार्यालयों के अधिष्ठान मद हेतु इस धनराशि प्रस्तावित है।
<b>योग-</b>		<b>50515.59</b>	
